

平成30年7月豪雨に係る宇和島市災害廃棄物処理実行計画(第2版)の概要

平成30年12月 宇和島市

第2章 被害状況と災害廃棄物の量

被害状況(平成30年12月28日時点)

区分	戸数
建物全壊	61棟
建物大規模半壊	115棟
建物半壊	801棟
一部損壊	781軒
計	1,758件
土砂災害	約350箇所


※今後、損壊家屋等の解体・撤去の状況等を踏まえ、災害廃棄物処理の各過程において災害廃棄物の量及び質に係る精査を行うこととしており、災害廃棄物の推計量について変動しうることに留意。

災害廃棄物の量(平成30年12月28日推計値)

品目	発生量(推計)	備考
木くず	5,143t	家具類含む
その他可燃物	2,332t	
不燃物	1,447t	
金属類	665t	
コンクリートがら	10,900t	ブロック・瓦含む
混合廃棄物	6,260t	処理困難物等
廃家電	438t	家電4品目、小型家電等
計	27,185t	
廃棄物混じり土砂	10,103t	
合計	37,288t	


処理状況

平成30年12月末現在までの災害廃棄物の処理実績は4,288トン(処理進捗率約11.5%)となっている。



第4章 災害廃棄物の処理方法

災害廃棄物の処理フロー(平成30年12月28日時点)

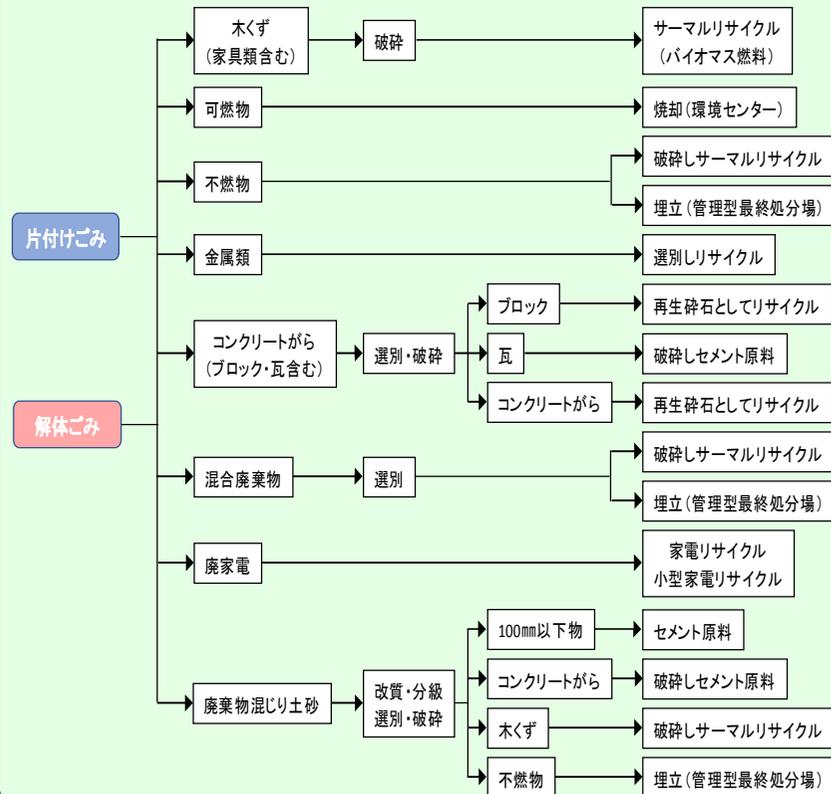

第6章 処理スケジュール

スケジュール

	平成30年						平成31年					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
災害廃棄物処理実行計画		策定		進行管理			第2版改訂		進行管理			
災害廃棄物の撤去	被災現場からの撤去											
家屋等解体(公費解体)	損壊家屋等の解体(約270件予定)											
1次仮置場(片付けごみ)	搬入・粗選別・搬出	撤去										
1.5次仮置場(片付けごみ)	搬入・粗選別・搬出						撤去					
2次仮置場(解体ごみ)	搬入・粗選別・搬出											
災害廃棄物の搬出・処理(片付けごみ)	中間処理・最終処分											
災害廃棄物の搬出・処理(解体ごみ)	中間処理・最終処分											

片付けごみの1次仮置場にある災害廃棄物については、最優先で処理することとし、平成30年9月末までに処理を完了した。
 1.5次仮置場にある災害廃棄物については、平成30年12月末までにおおむね処理を完了した。
 2次仮置場の解体ごみについては、平成31年6月末までの処理完了を目指す。
